


Одобрявам:

Инж. Добромир Добрев

Кмет на Община Горна Оряховица

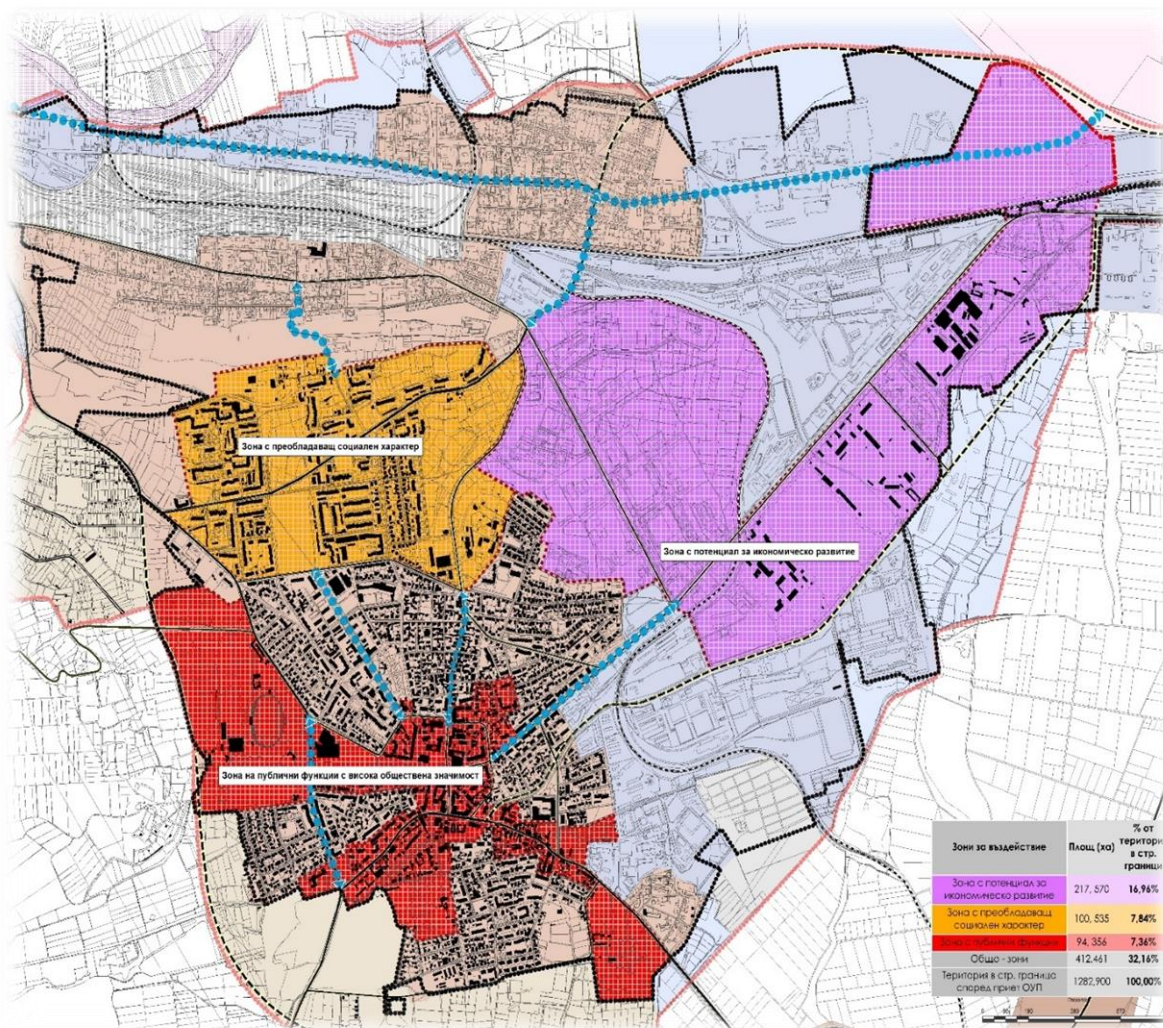

ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) 2014-2020Г. НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание

Въведение	1
Структура на финалния доклад-отчет	3
Актуализирана матрица - бюджет	4
Преглед на постигнатия напредък	5
Преглед на постигнатия напредък	11
Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР	39
Основни изводи и препоръки за следващия период	40

ВЪВЕДЕНИЕ

Въведение

Финалният доклад – отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Горна Оряховица за периода 2014-2020г. е изготвен в изпълнение на т.5.2. от Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, публикувано на 14.03.2019 г., одобрено със Заповед №РД-02-36-340 на министъра на регионалното развитие и благоустройството, през втората половина на 2020 г. Финалният доклад – отчет се одобрява от Кмета на общината и се представя за информация пред Общински съвет – Горна Оряховица.

Цели

Изготвянето на финалния доклад-отчет за изпълнение на ИПГВР на град Горна Оряховица е ориентирано към постигането на следните цели:

- (1) Систематизиране и оценка на резултатите от изпълнението на ИПГВР в периода 2014-2020 г.;
- (2) Включване в матрицата-бюджет на други нови проекти/ проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР;
- (3) Актуализиране на матрицата-бюджет;
- (4) Идентифициране на проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво;
- (5) Препоръки за следващия програмен период.

Обект

Финалният доклад-отчет разглежда устойчивото и интегрирано развитие на град Горна Оряховица, фокусирано в три типа целеви зони за въздействие, в чиито обхват е включена над 65% от територията на града.

Предмет

Предмет на разработката е интегрираното развитие на град Горна Оряховица, свързано с изпълнението на проекти и инициативи с принос към стратегията, приоритетите и целите на ИПГВР. В доклада са разгледани направените инвестиции по зони за въздействие, както и постигнатите резултати по приоритетни области: икономическо развитие; социална интеграция; качествена градска среда; околна среда; достъпност и самоуправление.

Отчетен период

Финалният доклад-отчет обхваща периода от 2014г. до края на 2020г. За целите на оценката на степента на изпълнение са определени две основни групи: проекти, за които не е отчетен напредък в изпълнението и за които не се предвижда реализация до края на 2023г. и проекти, за които е отчетено изпълнение, като в тях са включени следните категории: „Приключени в периода 2014-2020г.“; „В процес на изпълнение“ и „Очакващи финансиране до 2023г.“.

Включването на проекти, които са в изпълнение и за които се очаква финансиране в групата на изпълнените проекти е обусловено от факта, че основният инструмент за реализация на ИПГВР е Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в

ВЪВЕДЕНИЕ

растеж“ 2014-2020, която по своята същност представлява средносрочен документ за реализация на планираните проекти по зони за въздействие и е със срок на усвояване на планираните средства до 2023г. В отчета са включени и проекти или части от тях, които са реализирани след 2014г., независимо, че са финансирани в предходния програмен период.

СТРУКТУРА НА ФИНАЛНИЯ ДОКЛАД-ОТЧЕТ

Структура на финалния доклад-отчет

Финалният доклад – отчет за изпълнението на ИПГВР на град Горна Оряховица за периода 2014-2020г. включва петте елемента, дефинирани в т.5.2. на Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, публикувани на 14.03.2019г., одобрени със Заповед №РД-02-36-340 на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(1) Актуализирана матрица-бюджет, в която са включени изискуемите проекти в резултат на извършен преглед на проектите, включени в зоните за въздействие на ИПГВР и идентифицирани други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР;

(2) Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;

(3) Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и информацията за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода;

(4) Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР;

(5) Основни изводи и препоръки за следващия период.

АКТУАЛИЗИРАНА МАТРИЦА - БЮДЖЕТ

Актуализирана матрица - бюджет

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Преглед на постигнатия напредък

I. Обща информация

Изготвянето на Финалния доклад-отчет на Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) се базира на указанията и насоките в Методическите насоки. За разработването на документа е използвана следната последователност:

- ✓ Документално проучване, набиране и селектиране на данни и информация за целите на оценката.
- ✓ Обработване, обобщение, анализ и оценка на количествени и качествени данни;
- ✓ Изготвяне на Финалния доклад-отчет на ИПГВР 2014-2020 на град Горна Оряховица.

ИПГВР на град Горна Оряховица е разработен в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/006 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна Оряховица”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.

ИПГВР е основен документ за развитието на град Горна Оряховица, е стратегически документ за пространствена и времева координация, стратегически цели, приоритети, конкретни мерки и проекти, насочени към подобряване условията на живот и икономическа среда на територията на града. ИПГВР на гр. Горна Оряховица е органична част на Общинския план за развитие (ОПР) на Горна Оряховица 2014-2020 г. и доразвива в детайли стратегията на общинския план. Нещо повече, той може да бъде възприет като инструмент за реализация на общинския план, т.е. като средство за постигане на общинските цели и приоритети. Това се дължи на факта, че ИПГВР представлява инструмент за участие на общината в разпределението на средствата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

1.1. Зони за въздействие

С ИПГВР на град Горна Оряховица са определени три вида зони за въздействие, включващи признаците за интегрираност, които трябва да ги характеризират и в които са обследвани проблемите за развитие на съответните територии.

Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, издадени от МРРБ през 2010 г., зоната за въздействие представлява „обособена градска територия с определено основно функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове“. Различават се три вида – зона с преобладаващ социален характер, зона с потенциал за икономическо развитие и зона на публична функция с висока обществена значимост. В тези зони ще се съсредоточат наличните ресурси през периода до 2020 г., като се счита, че „енергията на развитие“, генерирана в тях, ще се разпространи и ще спомогне за развитието и на съседните градски територии, като дори ще окаже благоприятно влияние върху цялата община. Концентрацията на ресурси и активности в добре проучени и аргументирани зони за въздействие е гаранция за мултиплициране на положителния ефект от интервенциите.

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК


Това обуславя важноста на оптималния избор на трите зони за въздействие на гр. Горна Оряховица.

- ✓ **Зона с преобладаващ социален характер** – основно зоната е разположена в кв ”Пролет”, като към зоната е приобщена територия, разположена източно от ул. „Цар Освободител“ и заключена между нея и ул. „Стоил Войвода“. Съгласно действащия ОУП заема площ от 100, 535ха




- ✓ **Зона с публични функции с обществена значимост** – основно обхваща централна градска част, района на болницата, на запад обхваща и района на стадиона. Съгласно действащия ОУП заема площ от 94, 356ха

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

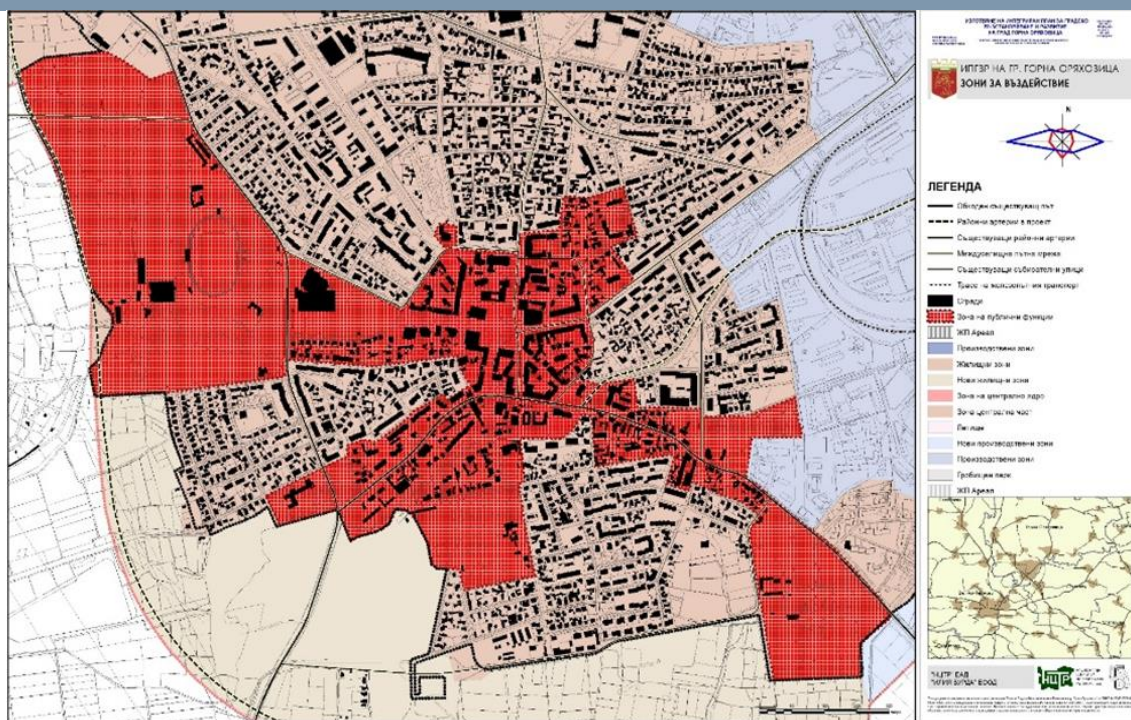


- ✓ **Зона с потенциал за икономическо развитие** – включва предприятията по протежение на ул. „Иван Момчилов“ и граничи на запад с р-н Север (ул. „Цар Освободител“), на югозапад с ЦГЧ, а на изток с ж.п. линията Горна Оряховица – Лясковец - Елена. Съгласно действащия ОУП заема площ от 217, 570 - 535ха

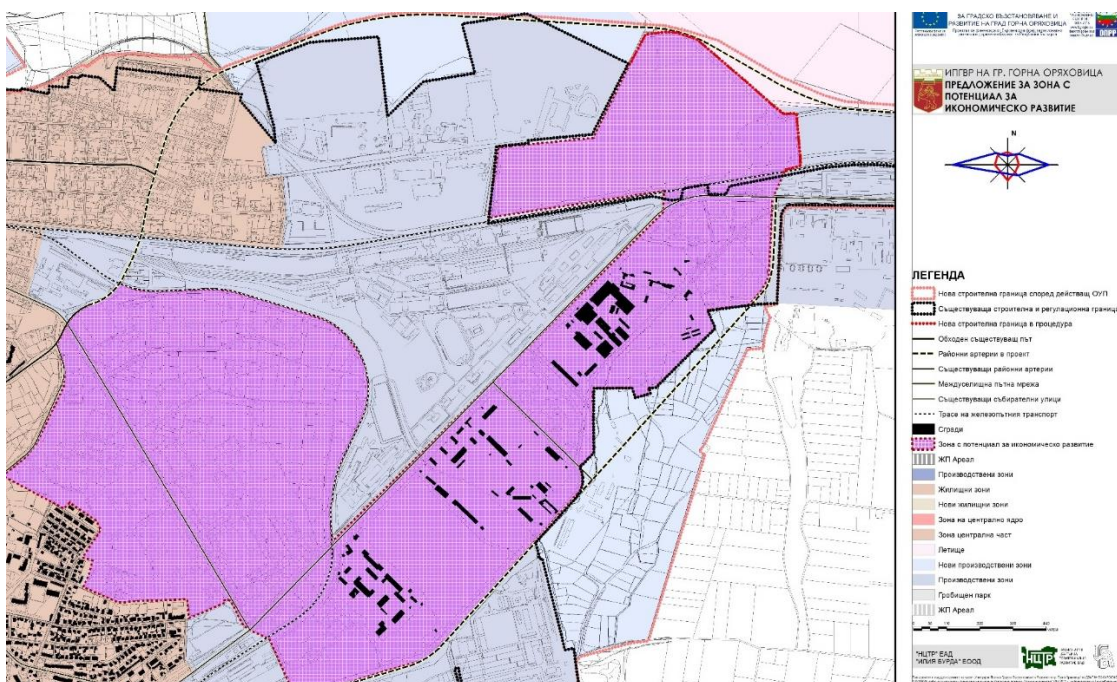

зони за въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

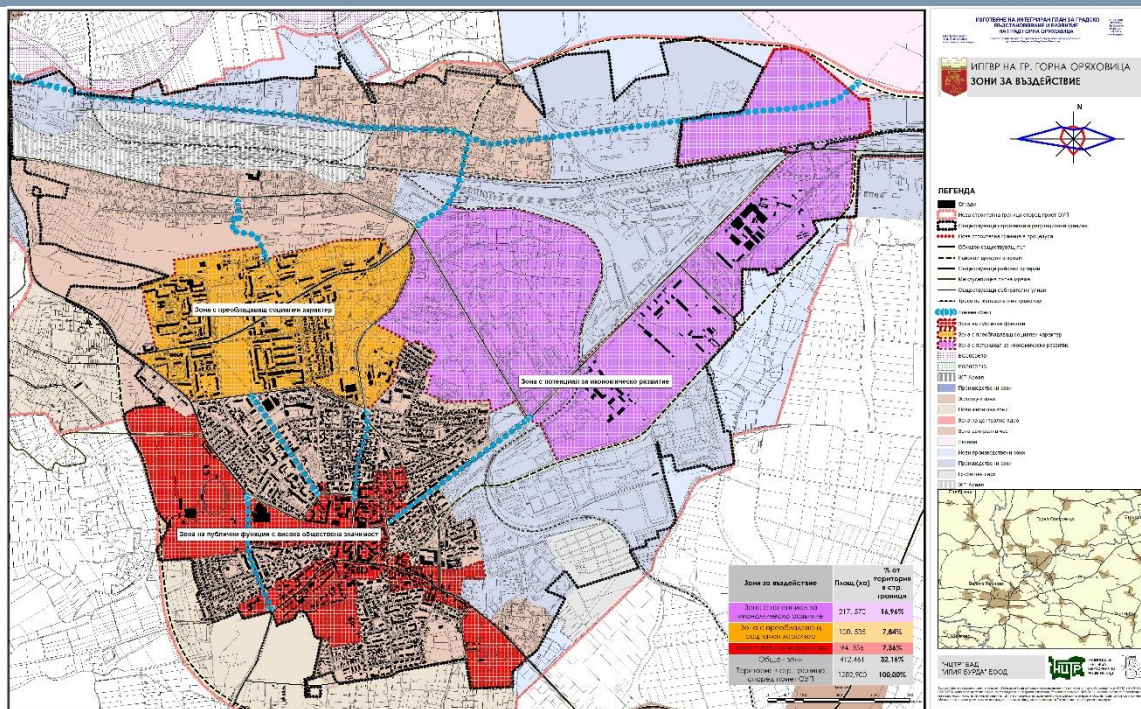

1.2. Стратегическа рамка за развитието на град Горна Оряховица

За периода на действие на Плана, Община Горна Оряховица насочва усилията си с цел постигане на определената визия чрез мерки и проекти за осъществяване на цялостната стратегическа рамка на ИПГВР.

Заложената Визия в ИПГВР е „Община Горна Оряховица – конкурентна и привлекателна европейска община, основана на балансирано развитие на територията, икономика на знанието и иновациите, чиста и хармонична околна среда, сигурност и висок жизнен стандарт.“

Стратегическите цели на ИПГВР са изведени в контекста на действащия ОПР Горна Оряховица 2014-2020, като са доразвити и модифицирани съобразно ограничения обхват и спецификата на обекта – 3 зони за въздействие.

- П 1: Постигане на икономически растеж основан на знание и заетост;
- П 2: Инфраструктурно развитие;
- П 3: Повишаване на качеството на живот;
- П 4: Околна среда;
- П 5: Добро управление и достъп до обществени услуги.

Запазвайки структурата и предметната насоченост на стратегическия пакет от общинския план за развитие, към реализацията на визията на ИПГВР се насочват следните стратегически цели:

- СЦ 1: Оптимизиране на градския потенциал за постигане на икономически растеж над националния;
- СЦ 2: „Зелено” развитие на градската инфраструктура и среда;

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

- СЦ 3: Подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички;
- СЦ 4: Добро управление и засилено гражданско участие.

Тези стратегически цели, освен че са обвързани с приоритетните сфери на ОПР Горна Оряховица, подпомагат постигането на визията за развитие на града до 2020 г.

Стратегията на ИПГВР, адресирана по зони на въздействие, може да се артикулира в специфични за всяка от зоните приоритетни намеси. Осъществяването на тези намеси ще подпомогне постигането на напредък в някоя от 4-те приоритетни области, което, от своя страна, ще насърчи реализацията на стратегическите цели на ИПГВР. Тази обвързаност е показана на фигурите по долу.



ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК



ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Преглед на постигнатия напредък

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР

2.1. Инвестиционна програма по Ос 1 на ОПРР

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Горна Оряховица е основен документ за развитие на града за периода до 2020 г., който в значителна степен осигурява възможност за финансиране със средства от Оперативните програми и други финансови инструменти. Източниците за финансиране на проектите, определени в ИПГВР на град Горна Оряховица са следните: Инвестиционна програма по Ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; Собствени средства за съфинансиране; Изцяло собствени средства; Републикански бюджет; Национални фондове; Други инвестиционни фондове; Частни инвеститори; Дарения.

Инвестиционната програма на гр. Горна Оряховица е средносрочен документ за реализация на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Горна Оряховица разработен за финансовата рамка 2014-2020 г. Инвестиционната програма е насочена към реализиране на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Инвестиционната програма на гр. Горна Оряховица следва заложените Визия и Цели на ИПГВР на гр. Горна Оряховица за превръщане на град Горна Оряховица в привлекателен и проспериращ град, базиран на: икономически растеж, здравословна екологична среда, висок жизнен стандарт, качествени услуги, осигуряване на равни възможности за всички, приобщаваща среда и автентичен образ.

Основната цел на програмата е повишаване на качеството на живот и растеж основан на концентрация и ефективно използване на ресурсите, развитие и модернизация на инфраструктурата, опазване на околната среда и социално приобщаване.

Инвестиционната програма включва списък от осем индикативни основни проекта и пет индикативни резервни проекта, които са предвидени да бъдат реализирани в трите зони за развитие на гр. Горна Оряховица, определени в ИПГВР на гр. Горна Оряховица: Зона с публични функции с висока обществена значимост; Зона с преобладаващ социален характер и икономическа зона. Проектите включени в програмата са насочени към подобряване на енергийната ефективност в административни и жилищни сгради, подобряване на градската среда, подобряване на образователната инфраструктура, изграждане на социална инфраструктура, обновяване и модернизация на културна инфраструктура, подобряване на условията за икономическото развитие.

Инвестиционната програма на гр. Горна Оряховица е одобрена от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. през месец февруари 2016 г. На 01.03.2016 г. Между Община Горна Оряховица и Министерство на регионалното развитие и благоустройството се сключи Споразумение за реализация на Инвестиционна програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0001-C01 на обща стойност 20 056 027,24 лв., и срок на изпълнение до 2023 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Горна Оряховица за изпълнение на индикативния списък с основните

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

проекти, съгласно Приложение №1 от Инвестиционната програма, представлява следната индикативна максимална сума: 19 046 218,72лв., разпределен по приоритети както следва:

Тематична цел/ инвестиционен приоритет/ група дейности		Финансов ресурс от ЕФРР (85%), в лв.	Национално участие (15%), в лв.	Обща индикативна стойност на БФП, в лв.
Тематична цел 4, в т.ч.:	Подпомагане на преминаването на нисковъглеродна икономика във всички сектори	2 097 074.30	370 071.93	2 467 146.23
<i>Инвестиционен приоритет 4в</i>	Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор	2 097 074.30	370 071.93	2 467 146.23
<i>Инвестиционен приоритет 4д</i>	Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата	0.00	0.00	0.00
Тематична цел 6, в т.ч.:	Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност	6 164 058.11	1 087 774.96	7 251 833.07
<i>Инвестиционен приоритет 6е, в т.ч.:</i>	Предприемане на действия за подобряване на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително пререструктурираните зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума	6 164 058.11	1 087 774.96	7 251 833.07
Група дейности	Градска среда	4 789 157.47	845 145.44	5 634 302.91
Група дейности	Зони с потенциал за икономическо развитие	1 374 900.64	242 629.52	1 617 530.16
Тематична цел 9, в т.ч.:	Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация	5 455 391.31	962 716.11	6 418 107.42

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

<i>Инвестиционен приоритет 9а, в т.ч.:</i>	Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище	5 455 391.31	962 716.11	6 418 107.42
Група дейности	Социална инфраструктура	2 387 410.77	421 307.78	2 808 718.55
Група дейности	Културна инфраструктура	3 067 980.54	541 408.33	3 609 388.87
Тематична цел 10, в т. ч.:	Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот	2 472 762.20	436 369.80	2 909 132.00
<i>Инвестиционен приоритет 10а</i>	Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение	2 472 762.20	436 369.80	2 909 132.00

Към отчетния период, изпълнени, приключени и отчетени са следните проектни предложения:

1. Договор № BG16RFOP001-1.027-0001-C01, за изпълнение на проект „Подобряване на образователната среда в гр.Горна Оряховица“, като проекта обхваща обекти в обществена и социална зона. Съгласно матрицата бюджет това са О-1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ „Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица, О-2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Бодра смяна", гр. Горна Оряховица, С - 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОДЗ "Елена Грънчарова" гр. Горна Оряховица. Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП.

2 Договор № BG16RFOP001-1.027-0002-C01, за изпълнение на проект Изграждане на приют в гр.Горна Оряховица .Проекта се реализира в социална зона.В матрицага бюджет е под номер С - 5 Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на "Приют" за бездомни лица с

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

капацитет 15 места, гр. Горна Оряховица.. Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП;

3. Договор № BG16RFOP001-1.027-0003-C01, за изпълнение на проект „Обновяване на градската среда в гр.Горна Оряховица“ . Проекта обхваща обекти от обществената зона..В матрицата бюджет същите са под номера О - 12 Реконструкция на площад "Георги Измирлиев" и организация на улична регулация, включително подмяна на колектори по ВИК мрежата и О - 15 Реконструкция и модернизация на парк "Детски кът" , гр. Горна Оряховица. Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП;

4. Договор № BG16RFOP001-1.027-0004-C02, за изпълнение на проект „Подобряване на условията за икономическо развитие“обхваща обект от икономическата зона - Проект И-6 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Иван Момчилов" (1) (о.т.900-о.т.899-о.т.898-о.т.897-о.т.894-о.т.886-о.т.885-о.т.884-о.т.1013-о.т.883-о.т.857-о.т.856 по ПУП на ИЗП) и ул. "Цар Освободител" (2) (о.т.855-о.т.854 - о.т. 853 - о.т. 137 по ПУП на ИЗП), като е изпълнена, частта касаеща ул."Ив.Момчилов".Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП;

5. Договор №BG16RFOP001-1.027-0005-C02, за изпълнение на проект Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр.Горна Оряховица, като обхваща обект от обществената зона - Проект О-5 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда на на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица. Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП;

6. Договор №BG16RFOP001-1.027-0006-C01, за изпълнение на проект Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица,. като обхваща обекти от обществената зона О- 23 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 252, УПИ I /ул. "Росица" № 2-4-6-8,/ и О - 33 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 255, УПИ I /изпълнен ул. "Камчия" № 4-6-8, / от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП; и от Допълнителен списък проектни идеи към Инвестиционната програма по Ос 1, Списък с нови проектни идеи/ обекти, подбрани в съответствие с процедурата от Фаза 1 на приложение П от настоящите изменени Насоки за кандидатстване, във Функционални връзки - Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр.Горна Оряховица, ул. „Генерал Скобелев“№ 6 и 8 с регистрирано СС „Генерал Скобелев 6/8“

В процес на изпълнение са следните проектни предложения:

1. Договор №BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица“ като обхваща обект от обществената зона О - 45 Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център" за жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ I – за СПЗУ, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП;

2. Договор №BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в гр.Горна Оряховица“ Проект - О 16 Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица , като обхваща обект от обществената зона - О 16 Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица.Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП;

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект, който ще стартира 2021 и ще бъде приключен до 2023 година.

Проект Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица обхваща обект от обществената зона , О-6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване и изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ "Братя Грънчарови - 2002", гр. Горна Оряховица. Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП; Към края на отчетния период/31.12.2020, проектът е с одобрен, в подготовка за сключване на договор за БФП и ФИ/

Прекратена работа по проект: .

Изграждане на социални жилища в, гр.Горна Оряховица, - същия попада в Социална зона, в матрицата -бюджет С - 4 Изграждане на 28 броя социални жилища /70 обитатели/ за лица в риск. УПИ VIII, квартал 89 по ПУП на ЦГЧ на гр. Г. Оряховица - Проектът е от основния списък с обекти Приложение №1 към ИП Проекта прекратен в етап на подготовка на проектно предложение, поради възникнала силна обществена нетърпимост и неприемане на проекта

В Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица са заложили следните индикатори за изпълнение:

Индикатор	Мерна единица	Междинна цел 2018 г.	Крайна цел 2023 г.	Постигнато към 31.12.2020
Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/годишно		451177.91	317 990
Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони	квадратни метри	53000	72800	72 285.62 30 470*
Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура	лица	123	786	790
Рехабилитирани жилища в градски райони	жилища		30	
Население, ползващо подобрените социални услуги	лица	0	300	94 300*
Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квадратни метри		2168.15	3 703.41

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

В Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица за междинна цел в индикаторите за изпълнение са заложили за постигане до края на 2018 г. следните индикатори: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 53 000 кв. м. и Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура – 123 лица. И по двата индикатора Община Горна Оряховица е изпълнила своите цели и е постигнала заложените показатели.

По отношение на крайната цел на индикаторите е видно, че при индикатори: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони, Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура, Население, ползващо подобрените социални услуги и Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони ще имаме преизпълнение на заложените стойности.

Забележка: Относно постигането на индикаторите към 31.12.2020 г. със звездичка са отбелязани стойности на индикатори на проекти, които са в изпълнение към момента на изготвяне на доклада. Проектите са: „Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица със заложен индикатор за Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 30 470 кв. м и „Създаване на Кризисен център, град Горна Оряховица“ със заложен индикатор за Население, ползващо подобрените социални услуги – 300 лица и двата индикатора ще спомогнат за преизпълнение на заложените крайни цели

Единствено неизпълнение ще бъде отчетено при индикатор Рехабилитирани жилища в градски райони, поради невъзможност за реализация на проекта.

2.2. Напредък по изпълнението на проектите по зони на въздействие

Обектите включени в ИПГВР на град Горна Оряховица съгласно матрицата бюджет , са разпределени по зони, както следва:

1. Зона с публични функции с обществена значимост - Обществена зона

Проект О-1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ „Кирил и Методий”, гр. Горна Оряховица

Проект О-2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Бодра смяна", гр. Горна Оряховица

Проект О-3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда РУП на МВР, гр. Горна Оряховица

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект О-4 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда на общинска администрация, гр. Горна Оряховица

Проект О-5 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица

Проект О-6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване и изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ "Братя Грънчарови - 2002", гр. Горна Оряховица.

Проект О- 7 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на НЧ "Напредък 1869", гр. Горна Оряховица

Проект О- 8 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Младежки дом /вкл. Обзавеждане и оборудване на Общински детски комплекс/ гр. Горна Оряховица

Проект О- 9 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Исторически музей, гр. Горна Оряховица

Проект О-10 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Художествена галерия, гр. Горна Оряховица

Проект О -11 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Горна Оряховица

Проект- О12 Реконструкция на площад "Георги Измирлиев" и организация на улична регулация, включително подмяна на колектори по ВИК мрежата

Проект - О 13 Реконструкция и модернизация на парцел за озеленяване, включително изграждане на площадка за игра, квартал 171 по ПУП на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица.

Проект - О 14 Изграждане на "Парк - УПИ I - за парк, кв. 135, гр. Горна Оряховица.

Проект - О 15 Реконструкция и модернизация на парк "Детски кът" , гр. Горна Оряховица

Проект - О 16 Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект - О 17 Изграждане на Футболно игрище и Тренировъчен стадион, озеленяване и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица

Проект - О 18 Основен ремонт/Реконструкция на стадион "Локомотив", озеленяване и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица

Проект – О 19 Изграждане на на обслужваща многофункционална сграда към спортен комплекс в УПИ I кв. 199, гр. Горна Оряховица

Проект - О 20 Изграждане на 4 броя тенис кортове, УПИ I, кв. 199 – Горна Оряховица и прилежаща инфраструктура

Проект - О 21 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 65, УПИ XIII"

Проект - О 22 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 65, УПИ XIII

"Проект О- 23 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 252, УПИ I"

Проект О-24 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 252, УПИ I

Проект О-25 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 253, УПИ I

Проект О-26 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 253, УПИ I

Проект О-27 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 253, УПИ IV

Проект О - 28 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 253, УПИ IV

"Проект О - 29 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 783, УПИ I"

Проект О - 30 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 783, УПИ I

Проект О - 31 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 250, УПИ I

Проект О - 32 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 250, УПИ I

Проект О - 33 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 255, УПИ I

Проект О - 34 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 255, УПИ I

Проект О - 35 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 203, УПИ III

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект О - 36 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ III

Проект О - 37 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 203, УПИ II

Проект О - 38 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ II

Проект О - 39 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 203, УПИ XIV

Проект О - 40 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ XIV

Проект О - 41 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 130, УПИ VII

Проект О - 42 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 130, УПИ VII

Проект О - 43 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 240, УПИ III

Проект О - 44 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 240, УПИ III

Проект О - 45 Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ I – за СПЗУ, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица.

Проект О -46 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Странджа" (1) о.т.502-о.т.503-о.т.485-о.т.484) и ул. "Оборище" (2) о.т.343-о.т.344-о.т.345-о.т.346-о.т.347-о.т.501)

Проект О-47 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Освободител" (1) о.т.303-о.т.304-о.т.544-о.т.543-о.т.542-о.т.739-о.т.740-о.т.610-о.т.609)

Проект О-48 Рехабилитация на ул. "Георги Измирлиев" (1) (о.т.611-о.т.617-о.т.619-о.т.620-о.т.621-о.т.622-о.т.623-о.т.624), ул. "Бунар Хисар" (2) (о.т.651-о.т.652-о.т.647-о.т.645) и ул. "Въстаническа" (3) (о.т. 624-о.т.625-о.т.646-о.т. 677)

Проект О - 49 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Асен" (1) (о.т.228-о.т.227-о.т.227-о.т.250-о.т.249-о.т.248-о.т.247-о.т.246-о.т.245-о.т.244-о.т.242-о.т.409-о.т.408-о.т.407)

Проект О - 50 Рехабилитация на ул. "Мано Тодоров" (1) (о.т.160-о.т.157-о.т.158-о.т.175-о.т.176-о.т.185), ул. "Драгоман" (2) (о.т.192-о.т.191-о.т.190-о.т.189-о.т.188), ул. "Сидер Войвода" (3) (о.т.193-о.т.194-о.т.195-о.т.196-о.т.261-о.т.262-о.т.263-о.т.264-о.т.265-о.т.266-о.т.267-о.т.381-о.т.480-о.т.479-о.т.271 и о.т.221-о.т.213-о.т.212-о.т.207-о.т.206) и ул. "Хан Крум" (4) (о.т.566-о.т.567-о.т.568-о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185-о.т.186-о.т.187-о.т.188-о.т.559-о.т.262)

Проект О - 51 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Александър Стамболийски" (1) (о.т.275-о.т.295-о.т.294-о.т.293-о.т.395)

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект О - 52 Реконструкция на зеленчуков пазар, гр. Горна Оряховица

Допълнителен списък проектни идеи към Инвестиционната програма по Ос 1

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий“ № 34 с регистрирано СС “Прогрес

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Вазов“ №5 с регистрирано СС „Раховец 85

Рехабилитирани улици, посочени в индикативния списък с проекти в ИПГВР, но липсващи в матрица-бюджет

ул. "Хаджи димитър", гр. Горна Оряховица от о. Т. 328 до о. Т. 392

Изграждане на кръгово кръстовище на улици "Княз Борис I" и "Цар Освободител"

ул. "Патриарх Евтимий", гр. Горна Оряховица

ул. "Янко Боянов", гр. Горна Оряховица

Постигнат напредък по изпълнение на проектите в зоната:

✓ Реализирани проекти:

Проект О-1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ „Кирил и Методий”, гр. Горна Оряховица

Проект О-2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Бодра смяна", гр. Горна Оряховица;

Проект О-5 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица

Проект О -11 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Горна Оряховица

Проект- О12 Реконструкция на площад "Георги Измирлиев" и организация на улична регулация, включително подмяна на колектори по ВИК мрежата

Проект - О 15 Реконструкция и модернизация на парк "Детски кът" , гр. Горна Оряховица

Проект - О 18 Основен ремонт/Реконструкция на стадион "Локомотив", озеленяване и благоустройство на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

"Проект О- 23 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 252, УПИ I/ гр.Горна Оряховица, ул. "Росица" № 2-4-6-8,/"

Проект О - 31 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 250, УПИ I изпълнен; гр.Горна Оряховица, ул. "Отец Паисий" 63,

Проект О - 33 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 255, УПИ I изпълнен гр.Горна Оряховица, ул. "Камчия" № 4-6-8,;

Проект О - 50 Рехабилитация на ул. "Мано Тодоров" (1) (о.т.160-о.т.157-о.т.158-о.т.175-о.т.176-о.т.185), ул. "Драгоман" (2) (о.т.192-о.т.191-о.т.190-о.т.189-о.т.188), ул. "Сидер Войвода" (3) (о.т.193-о.т.194-о.т.195-о.т.196-о.т.261-о.т.262-о.т.263-о.т.264-о.т.265-о.т.266-о.т.267-о.т.381-о.т.480-о.т.479-о.т.271 и о.т.221-о.т.213-о.т.212-о.т.207-о.т.206) и ул. "Хан Крум" (4) (о.т.566-о.т.567-о.т.568-о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185-о.т.186-о.т.187-о.т.188-о.т.559-о.т.262) - ул. "Сидер Войвода" - частично изпълнения и ул. "Хан Крум" - частично изпълнена от о. т. 262 до о. Т. 195 и от о. Т. 568 до о. Т. 185

Проект О - 51 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Александър Стамболийски" (1) (о.т.275-о.т.295-о.т.294-о.т.293-о.т.395)

Рехабилитирани улици посочени в индикативния списък с проекти в ИПГВР, но липсващи в матрицата бюджет

ул. "Хаджи димитър", гр. Горна Оряховица от о. Т. 328 до о. Т. 392

Изграждане на кръгово кръстовище на улици "Княз Борис I" и "Цар Освободител"

ул. "Патриарх Евтимий", гр. Горна Оряховица

ул. "Янко Боянов", гр. Горна Оряховица

✓ **Проекти в процес на реализация**

Проект - О 16 Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица

"Проект О - 45 Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ I – за СПЗУ, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица.

✓ **Одобрен проект с бъдеща реализация.**

Проект О-6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване и

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ "Братя Грънчарови - 2002", гр. Горна Оряховица.

В зоната са посочени общо 58 обекта, от тях 19 са финансирани в т.ч. 16 реализирани, 2 в процес на реализация и 1 с предстояща реализация. Физическото изпълнение е 32,75%. Структурата на финансирането по източници е: Други средства от СФ, КФ – 59,44%, Собствени средства за съфинансиране 5,66%, Изцяло собствени средства 2,16%, Републикански бюджет 23,32%, Национални програми 7,49%, Други инвест. Фондове 1,93%, Частни инвеститори 0%, Други донори %, Дарения 0%

Общия размер на инвестициите в зоната е 22 095 хил. лв.

2. Зона с преобладаващ социален характер - Социална зона.

Проект С - 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОДЗ "Елена Грънчарова" гр. Горна Оряховица

Проект С - 2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ПТГ "Васил Левски", гр. Горна Оряховица

Проект С - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Щастливо детство", Горна Оряховица

Проект С - 4 Изграждане на 28 броя социални жилища /70 обитатели/ за лица в риск. УПИ VIII, квартал 89 по ПУП на ЦГЧ на гр. Г. Оряховица.

Проект С - 5 Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на "Приют" за бедомни лица с капацитет 15 места, гр. Горна Оряховица.

Проект С - 6 Изграждане на площадка за игра /уличен фитнес: 1). УПИ I, квартал 49 по ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица; 2). Изграждане на площадка за игра /уличен фитнес и места за паркиране - УПИ I за ЖС и УПИ II - за гаражи, квартал 7 по ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица

Проект С - 7 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 20, УПИ I

Проект С - 8 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 20, УПИ I

Проект С - 9 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 2, УПИ II

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

- Проект С - 10 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 2, УПИ II
- Проект С - 11 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 23, УПИ I
- Проект С - 12 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 23, УПИ I
- Проект С - 13 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 45, УПИ I
- Проект С - 14 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 45, УПИ I
- Проект С - 15 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 26, УПИ I
- Проект С - 16 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 26, УПИ I
- Проект С - 17 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 22, УПИ II
- Проект С - 18 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 22, УПИ II
- Проект С - 19 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 61, УПИ I
- Проект С - 20 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 61, УПИ I
- Проект С - 21 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 19, УПИ III
- Проект С - 22 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 19, УПИ III
- Проект С - 23 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 19, УПИ IV
- Проект С - 24 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 19, УПИ IV
- Проект С - 25 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 43, УПИ I
- Проект С - 26 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 43, УПИ I
- Проект С - 27 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 27, УПИ II
- Проект С - 28 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 27, УПИ II
- Проект С - 29 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 28, УПИ II
- Проект С - 30 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 28, УПИ II

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект С - 31 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 64, УПИ II

Проект С -32 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 64, УПИ II

Проект С -33 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 35, УПИ II

Проект С -34 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 35, УПИ II

Проект С -35 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 35, УПИ XXIII

Проект С -36 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. достъпна среда, обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 35, УПИ XXIII

Проект С -37 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 30, УПИ VIII

Проект С -38 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 30, УПИ VIII

Проект С -39 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 30, УПИ III

Проект С -40 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 30, УПИ III

Проект С -41 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 70, УПИ III

Проект С -42 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 70, УПИ III

Проект С -43 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 72, УПИ I

Проект С -44 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 72, УПИ I

Проект С -45 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 69, УПИ I

Проект С -46 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 69, УПИ I

Проект С -47 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 63, УПИ V

Проект С -48 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 63, УПИ V

Проект С -49 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 63, УПИ III

Проект С -50 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 63, УПИ III

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект С -51 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 63, УПИ IV

Проект С -52 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 63, УПИ IV

Проект С -53 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 56, УПИ I

Проект С -54 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 56, УПИ I

Проект С -55 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 7, УПИ I

Проект С -56 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 7, УПИ I

Проект С -57 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 8, УПИ I

Проект С -58 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 8, УПИ I

Проект С -59 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 59, УПИ I

Проект С -60 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 59, УПИ I

Проект С -61 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 60, УПИ I

Проект С -62 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 60, УПИ I

Проект С -63 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 13, УПИ I

Проект С -64 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 13, УПИ I

Проект С -65 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ V

Проект С -66 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 16, УПИ V

Проект С -67 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ III

Проект С -68 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 16, УПИ III

Проект С -69 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ I

Проект С -70 Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 16, УПИ I

Проект С -71 Изграждане на ул. "Юрий Гагарин" (о.т.16-о.т.17-о.т.23-о.т.22-о.т.21-о.т.20-о.т.25-о.т.26-о.т.27-о.т.28) и улица (о.т.17-о.т.18-о.т.19)

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект С -72 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Акация" (1) (о.т.29-о.т.28-о.т.27-о.т.26-о.т.25)

Проект С -73 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Дружба" (о.т.136-о.т.156)

Допълнителен списък проектни идеи към Инвестиционната програма по Ос 1

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр.Горна Оряховица, ул. „Борима“№ 19 с регистрирано СС „Божура 19“

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. „Славянска“ №22 и 24 с регистрирано СС „Изгрев“

Реализирани проекти в зоната извън матрицата-бюджет

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. "Славянска " № 26, 28, гр. Горна Оряховица, кв. 1, УПИ XIX

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. "Раховец" № 5, 7 ,9, гр. Горна Оряховица, кв. 27, УПИ III

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – ул. "В. Левски" № 11, гр. Горна Оряховица, кв. 5, УПИ XVI

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. "Г. Бошнаков" № 31, гр. Горна Оряховица, кв. 72, УПИ III

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. "Ю. А. Гагарин" № 35, гр. Горна Оряховица, кв. 35, УПИ III

Рехабилитация на ул. "Славянска"

Рехабилитация ул. "Раховец"

Рехабилитация на ул. "Априлско въстание"

Рехабилитация на ул. "Цар Освободител" - частично изпълнена между о. т. 136 и о. т. 95 и между о. т. 542 и о. т. 859

Постигнат напредък по изпълнение на проектите в зоната:

✓ Реализирани проекти:

Проект С - 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОДЗ "Елена Грънчарова" гр. Горна Оряховица;

Проект С - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Щастливо детство", Горна Оряховица

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект С - 5 Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на "Приют" за бездомни лица с капацитет 15 места, гр. Горна Оряховица.

Проект С - 6 Изграждане на площадка за игра / уличен фитнес: 1). УПИІ, квартал 49 по ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица; 2). Изграждане на площадка за игра / уличен фитнес и места за паркиране - УПИІ за ЖС и УПИІІ - за гаражи, квартал 7 по ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица

Проект С - 9 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 2, УПИ ІІ /гр.Горна Оряховица/ ул. "Юрий Гагарин" №45-47,

Проект С - 13 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 45, УПИ І /гр.Горна Оряховица, ул. "П. Р. Славейков" № 26/,

Проект С - 19 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 61, УПИ І / гр.Горна Оряховица, ул. "Славянска" № 18 -20/,

Проект С - 25 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 43, УПИ І /гр.Горна Оряховица, ул. "Славянска" № 23/,

Проект С -65 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ V /гр.Горна Оряховица, ул. "Раховец" № 12/,

Проект С -67 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 16, УПИ ІІІ / гр.Горна Оряховица, ул. "П. Р. Славейков" № 17, 19/,

Проект С -71 Изграждане на ул. "Юрий Гагарин" (о.т.16-о.т.17-о.т.23-о.т.22-о.т.21-о.т.20-о.т.25-о.т.26-о.т.27-о.т.28) и улица (о.т.17-о.т.18-о.т.19)

Реализирани проекти в зоната извън матрицата-бюджет

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. "Славянска " № 26, 28, гр. Горна Оряховица, кв. 1, УПИ XIX

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. "Раховец" № 5, 7 ,9, гр. Горна Оряховица, кв. 27, УПИ ІІІ

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – ул. "В. Левски" № 11, гр. Горна Оряховица, кв. 5, УПИ XVI

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. "Т. Бошнаков" № 31, гр. Горна Оряховица, кв. 72, УПИ ІІІ

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. "Ю. А. Гагарин" № 35, гр. Горна Оряховица, кв. 35, УПИ III

Рехабилитация на ул. "Славянска"

Рехабилитация ул. "Раховец"

Рехабилитация ул. "Априлско въстание"

Рехабилитация та ул. "Цар Освободител" - частично изпълнена между о. т. 136 и о. т. 95 и между о. т. 542 и о. т. 859

С прекратено изпълнение

Проект С - 4 Изграждане на 28 броя социални жилища /70 обитатели/ за лица в риск. УПИ VIII, квартал 89 по ПУП на ЦГЧ на гр. Г. Оряховица - Проекта прекратен в етап на подготовка на проектно предложение, поради възникнала силна обществена нетърпимост и неприемане на проекта

В зоната са заложи общо 84 обекта, от тях 20 са финансирани и реализирани. Физическото изпълнение е 23,81% . Структурата на финансирането по източници е: Други средства от СФ, КФ – 6,60%, Собствени средства за съфинансиране 0,90% ,Изцяло собствени средства 0%, Републикански бюджет 2,36% , Национални програми 90,13%, Други инвест. Фондове 0% ,Частни инвеститори 0% Други донори % , Дарения 0%. Видно от структурата на източниците на финансиране е, че с най-голямо влияние в зоната е Националната програма за енергийна ефективност.

Общия размер на инвестициите в зоната е 15 329 хил лв.

3. Зона с потенциал за икономическо развитие - Икономическа зона

Проект И - 1 Изграждане на базова инфраструктура в индустриален парк "Горна Оряховица" (ВиК, улици, ограда)

Проект И -2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ПГХТ "Асен Златаров", Горна Оряховица

Проект И - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ПГЛПИ "Атанас Буров", Горна Оряховица

Проект И-4 Изграждане на обществено достъпни паркинги по ул. "Ив. Момчилов", ул. "Св.Княз Борис I" (о.т.855-о.т.901), гр. Горна Оряховица.

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект И-5 Изграждане на ул. с о.т. 226 - о.т. 222 - о.т. 220 - о.т. 201 - о.т. 204 - о.т. 205 - о.т. 209 - о.т. 823 (продължение на ул. "Антон Страшимиров" до пресечката с ул. "Княз Борис I")

Проект И-6 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Иван Момчилов" (1) (о.т.900-о.т.899-о.т.898-о.т.897-о.т.894-о.т.886-о.т.885-о.т.884-о.т.1013-о.т.883-о.т.857-о.т.856 по ПУП на ИЗП) и ул. "Цар Освободител" (2) (о.т.855-о.т.854 - о.т. 853 - о.т. 137 по ПУП на ИЗП)

Проект И-7 Изграждане на улица с о.т. 886 - о.т. 887 - о.т. 888 - о.т. 889 - о.т. 889 - о.т. 890 - о.т. 891 - о.т. 892 - о.т. 893 - о.т. 839 по ПУП на ИПЗ

Проект И-8 Изграждане на улица с о.т. 884 - о.т. 851 - о.т. 850 - о.т. 849 - о.т. 846 - о.т. 845 - о.т. 844 - о.т. 843 - о.т. 842 - о.т. 841 - о.т. 840 - о.т. 839 - о.т. 838 - о.т.837 - о.т. 836 - о.т. 835 - о.т. 834

Проект И-9 Изграждане на базова инфраструктура в кв. 63 и кв. 69 на нова СМФ зона (бивш военен терен) по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69

Проект И-10 Изграждане на паркинг в кв. 68 по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69

Постигнат напредък по изпълнение на проектите в зоната:

✓ Реализирани проекти:

Проект И -2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ПГХТ "Асен Златаров", Горна Оряховица

Проект И - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ПГЛПИ "Атанас Буров", Горна Оряховица

Проект И-4 Изграждане на обществено достъпни паркинги по ул. "Ив. Момчилов", ул. "Св.Княз Борис I" (о.т.855-о.т.901), гр. Горна Оряховица.

Проект И-6 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Иван Момчилов" (1) (о.т.900-о.т.899-о.т.898-о.т.897-о.т.894-о.т.886-о.т.885-о.т.884-о.т.1013-о.т.883-о.т.857-о.т.856 по ПУП на ИЗП) и ул. "Цар Освободител" (2) (о.т.855-о.т.854 - о.т. 853 - о.т. 137 по ПУП на ИЗП)

В зоната са заложи общо 10 обекта, от тях 4 са финансирани и реализирани. Физическото изпълнение е 40% . Структурата на финансирането по източници е: Други средства от СФ, КФ – 61,73%, Собствени средства за съфинансиране 3,81% ,Изцяло собствени средства 0%, Републикански бюджет 19,90% , Национални програми 10,29%, Други инвест. Фондове 0% ,Частни инвеститори 4,28% Други донори % , Дарения 0%.

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Видно от структурата на източниците на финансиране е, че с най-голямо влияние в зоната е финансирането от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

4.Група проекти: Функционални връзки

Проект ФВ - 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Първи юни", гр. Горна Оряховица

Проект ФВ - 2 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Детска ясла "Зорница", гр. Горна Оряховица

Проект ФВ - 3 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ЦДГ "Детска радост", Долна Оряховица

Проект ФВ - 4 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ЦДГ "Димитър Генков", село Поликрайще

Проект ФВ - 5 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ЦДГ ""Асен Разцветников"", село Драганово

Проект ФВ - 6 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ЦДГ ""Слънчице"", село Върбица

Проект ФВ - 7 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ ""Кирил и Методий"", гр. Долна Оряховица

Проект ФВ - 8 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ ""Климент Охридски"", с. Драганово

Проект ФВ - 9 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ ""Елин Пелин"", село Първомайци

Проект ФВ - 10 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ ""Отец Паисий"", село Писарево

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект ФВ - 11 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ ""Васил Левски"", село Върбица

Проект ФВ - 12 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ ""Кирил и Методий"", село Поликрайще

Проект ФВ - 13 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ПГЕЕ ""М. В. Ломоносов"", гр. Горна Оряховица

Проект ФВ - 14 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ПГЖПТ ""Н. Й. Вапцаров"", гр. Горна Оряховица

Проект ФВ - 15 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОДЗ ""Божур"", кв. ""Гарата"", гр. Горна Оряховица.

Проект ФВ - 16 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ „Паисий Хилендарски”, кв. ""Гарата"", гр. Горна Оряховица.

Проект ФВ - 17 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на СДГ ""Детски свят"", кв. ""Калтинец"", гр. Горна Оряховица.

Допълнителен списък проектни идеи към Инвестиционната програма по Ос 1

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр.Горна Оряховица, ул. „Генерал Скобелев“№ 6 и 8 с регистрирано СС „Генерал Скобелев 6/8“

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр.Горна Оряховица, ул. „Никола Петров“ № 75 с регистрирано СС „Никола Петров 75“

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. „Бузлуджа“ №5 с регистрирано СС „Ракета 3“

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Вазов“ №7 и 9 с регистрирано СС „Единство“

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. „Козлодуй“ №48 с регистрирано СС „Яйманови“

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр. Горна Оряховица, ул. „Струма“ №2 с регистрирано СС „Струма 2 - 2018“

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект с издадено становище от МЗ за проверка на съответствие на проектното предложение с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Горна Оряховица

"Рехабилитация на индустриални терени и застроени площи и етапно изграждане на енергийни мощности за собствено потребление, ползващи възобновяеми и алтернативни източници

Постигнат напредък по изпълнение на проектите в група Функционални връзки:

✓ **Реализирани проекти:**

Проект ФВ - 1 Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Първи юни", гр. Горна Оряховица

Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – гр.Горна Оряховица, ул. „Генерал Скобелев“№ 6 и 8 с регистрирано СС „Генерал Скобелев 6/8“

"Рехабилитация на индустриални терени и застроени площи и етапно изграждане на енергийни мощности за собствено потребление, ползващи възобновяеми и алтернативни източници

В група проекти „Функционални връзки” са заложи общо 24 обекта, от тях 3 са финансирани и реализирани. Физическото изпълнение е 12,5%. Структурата на финансирането по източници е: Други средства от СФ, КФ – 3,72%, Собствени средства за съфинансиране 1,47%, Изцяло собствени средства 0%, Републикански бюджет 1,57%, Национални програми 0%, Други инвест. Фондове 93,24%, Частни инвеститори 0%, Други донори %, Дарения 0%. Видно от структурата на източниците на финансиране е, че с най-голямо влияние в зоната е финансирането от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

5.Група проекти: Интегриран градски транспорт

Проект ИГТ - 1 Изграждане на светофарна уредба - кръстовище ул. "В. Левски"- ул."Славянска" - ул. "П. Р. Славейков", гр. Горна Оряховица

Проект ИГТ - 2 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Васил Априлов" (о.т.6-о.т.119-о.т.118-о.т.117-о.т.116 - о.т. 165 - о.т. 164 - о.т. 163 - о.т. 162 - о.т. 161 - о.т. 160 - о.т. 159 - о.т. о.т. 154 - о.т. 155 - о.т. о.т. 192 - о.т. 193 - о.т. 206 - о.т. 205 - о.т. 204 - о.т. 203 - о.т.225 - о.т. 227 - о.т. 232 - о.т. 233)

Проект ИГТ - 3 Рехабилитация/ реконструкция на ул."Св. Княз Борис I" (о.т.901 - о.т. 1014 - о.т. 907 - о.т. 834 - о.т. 833 - о.т. 981 - о.т. 832 - о.т. 983 - о.т. 831 - о.т. 830 - о.т. 987 - о.т.

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

990 - о.т. 829 - о.т. 933 - о.т. 828 - о.т. 996 - о.т. 827 - о.т. 826 - о.т.825 - о.т. 824 - о.т. 815 - о.т. 813 - о.т.813 - о.т.816 - о.т.817 - о.т. 819 - о.т. 820 - о.т.821 - о.т.822 - о.т.823)

Проект ИГТ - 4 Рехабилитация/реконструкция на ул."Антон Страшимиров" (о.т.2-о.т.13-о.т.99-о.т.119-о.т.226), гр. Горна Оряховица

Проект ИГТ - 5 Реконструкция на ул. "Съединение" в участъка ул. "Панайот Цвиков" до ул. "Цар Освободител"

Проект ИГТ - 6 Рехабилитация/реконструкция на кръстовище "Св. Княз Борис I" - "19-ти февруари" гр. Горна Оряховица

Проект ИГТ - 7 Изграждане на надлез над ж. п. линия от ул. "Антон Страшимиров" с кръстовището на ул. "Васил Левски" и ул. "Иван Момчилов"

Проект ИГТ - 8 Изграждане на надлез над ж. п. линия от ул. "Антон Страшимиров" до ул. "Крайбрежна"

Проект ИГТ - 9 Изграждане пешеходна и вело връзка от пл. Георги Измирлиев на запад към спортен комплекс Никола Петров. Изграждане на подлез за преминаване на ул. "Васил Априлов".

Проект ИГТ - 10 Подобряване на достъпността на градските автобусни спирки, вкл. понижени тротоари до спирките, специална настилка

Проект ИГТ - 11 Изработване на проект за интегриран градски транспорт на град Горна Оряховица

Постигнат напредък по изпълнение на проектите:

✓ Реализирани проекти:

Поради ограничения финансов ресурс и липсата на проектна готовност отпадна включването на проект Интегриран градски транспорт в Инвестиционната програма по Ос 1 на ОПРР.

Проект ИГТ - 2 Рехабилитация/реконструкция на ул. "Васил Априлов" (о.т.6-о.т.119-о.т.118-о.т.117-о.т.116 - о.т. 165 - о.т. 164 - о.т. 163 - о.т. 162 - о.т. 161 - о.т. 160 - о.т. 159 - о.т. о.т. 154 - о.т. 155 - о.т. о.т. 192 - о.т. 193 - о.т. 206 - о.т. 205 - о.т. 204 - о.т. 203 - о.т.225 - о.т. 227 - о.т. 232 - о.т. 233)

В група проекти „Интегриран градски транспорт” са заложили общо 11 обекта, от тях 1 е финансиран и реализиран . Физическото изпълнение е 9 % . Структурата на финансирането по източници е: Други средства от СФ, КФ – 0%, Собствени средства за съфинансиране 0% ,Изцяло собствени средства 0%, Републикански бюджет 100% ,

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Национални програми 0%, Други инвест. Фондове 0% , Частни инвеститори 0% Други донори % , Дарения 0%.

6.Група проекти: Меки мерки

Проект ММ - 1 Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността от резидентен тип „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места.

Проект ММ - 2 Разкриване и предоставяне на социалната услуга от резидентен тип "Приют" с капацитет 15 места.

Проект ММ - 3 Обучения на служителите от администрацията на община Горна Оряховица.

Проект ММ - 4 Въвеждане на комплексно административно обслужване на община Горна Оряховица.

Проект ММ - 5 Културно-етнографски форум, пл. Георги Измирлиев, гр. Горна Оряховица.

Проект ММ - 6 Международен конкурс за изпълнители на популярна песен "Нова музика", НЧ "Напредък", гр. Горна Оряховица.

Проект ММ - 7 Международен фолклорен фестивал "Раховче", НЧ "Братя Грънчарови", гр. Горна Оряховица.

Проект ММ - 8 Празник на горнооряховският суджук, парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица.

Проект ММ - 9 Културно-образователен форум, гр. Горна Оряховица. Проект ММ - 10 Информационна кампания за насърчаване на колоезденето.

Проект ММ - 11 Маркетингова стратегия на индустриален парк Горна Оряховица.

Проект ММ- 12 Осигуряване на възможности за заетост, в т.ч. чиракуване.

Проект ММ - 13 Разработване на програма за привличане на стратегически инвеститори в областта на хранителната индустрия.

Проект ММ - 14 Предоставяне на комплексни услуги включващи интервенции в следните направления: 1) подобряване достъпа до заетост; 2) подобряване достъпа до образование; 3) подобряване достъпа до социални и здравни услуги; 4) развитие на местната общност и преодоляване на негативните стереотипи.

Проект ММ - 15 Програма за намаляване броя на преждевременно напусналите училище и устойчиво задържане на учениците в образователната система.

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Проект ММ - 16 Програма за осигуряване на равен достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи и насърчаване на гъвкави начини за учене

Проект ММ - 17 Програма за активно приобщаване и подобряване пригодността за заетост.

Постигнат напредък по изпълнение на проектите:

✓ Реализирани проекти:

Проект ММ - 2 Разкриване и предоставяне на социалната услуга от резидентен тип "Приют" с капацитет 15 места.

Проект ММ - 6 Международен конкурс за изпълнители на популярна песен "Нова музика", НЧ "Напредък", гр. Горна Оряховица.

Проект ММ - 7 Международен фолклорен фестивал "Раховче", НЧ "Братя Грънчарови", гр. Горна Оряховица.

Проект ММ - 8 Празник на горнооряховският суджук, парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица.

Проект ММ - 9 Културно-образователен форум, гр. Горна Оряховица.

Проект ММ- 12 Осигуряване на възможности за заетост, в т.ч. чиракуване.

✓ Одобрен проект с бъдеща реализация.

Проект ММ - 1 Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността от резидентен тип „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места. Одобрен, с подписан договор за финансиране предстои реализация

В група проекти „Меки мерки“ са заложи общо 17 обекта, от тях 7 са финансирани, в т.ч 6 от тях са реализирани и 1 е с осигурено финансиране и предстояща реализация и реализиран . Физическото изпълнение е 41,17 % Структурата на финансирането по източници е: Други средства от СФ, КФ – 32,17%, Собствени средства за съфинансиране 0% ,Изцяло собствени средства 20,20%, Републикански бюджет 47,62% , Национални програми 0%, Други инвест. Фондове 0% ,Частни инвеститори 0% Други донори % , Дарения 0%.

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Отчитане на индикатори

Индикаторите за оценка и наблюдение са неотменна част от ИПГВР и дават възможност да се наблюдават промените, настъпващи в пространството на реализираните проекти - одобрените зони за въздействие. Те са част от плана за партньорство, публичност и прозрачност и са общоприет и задължителен инструмент на интегрираното градско планиране. Предложената система от индикатори покрива всички видове зони за въздействие и съответства на заложените мерки и проекти, които могат да бъдат финансирани по различните оперативни програми през следващия програмен период.

. Същите са диференцирани в няколко групи съобразно областта на интервенциите и типа на индикатори:

- Индикатори за продукт, които са пряко свързани с проектите и дейностите, след реализацията на които се създава определен продукт;
- Индикатори за резултати - с тях ще се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот (измерват ползите за съответната целева сфера и тематична област).

При избора на индикаторите за наблюдение и оценка на ИПГВР са спазени основните изисквания за яснота при формулирането им, възможност за отчитане на промените и наличие на информация, която да позволява тяхното прилагане. Те следват следните области на въздействие/инвестиционни приоритети и проекти на ИПГВР:

- Техническа инфраструктура;
- Зелена система, спорт и други публични пространства;
- Социална инфраструктура и административни сгради;
- Обитаване и жилищна среда;
- Функционални връзки с общинската територия .

Основните източници на данни за определяне на стойностите на индикаторите са Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и конкретната информация на ниво „проект”. Показателите за въздействие ще се осигуряват с информация от НСИ, проучвания и др. специализирана информация.

Система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ИПГВР Горна Оряховица 2014-2020

Тематична област	Категория индикатор	Индикатор	Мерна единица	Зона/система	Целева стойност	Стойност към 31.12.2020	% на изпълнение
Техническа инфраструктура	продукт	Рехабилитация на улици	м	О, С	5 786	3 955	68,34
	продукт	Реконструкция и изграждане на улици	м	И	6 920	1 156	16,70%
	продукт	Обновяване на централния градски площад	бр.	О	1	1	100
	продукт	Изграждане на	бр.	И	1	0	0

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

		индустриален парк					
	продукт	Изграждане на паркинги	бр.	И, С	3	2	66,66%
	резултат	Облагодетелствани от обновена градска среда	бр.	О, С, И	30 000	30 000	100%
Зелена система, спорт и други публични пространства	продукт	Обновяване на 3 парка	Бр.	О	3	2*	66,66%
	продукт	Изграждане на спортни площадки	бр.	О, С	3	1	33,33%
	продукт	Изграждане на спортен комплекс	бр.	О	1	0	0
Социална инфраструктура и административни сгради	продукт	Обновени детски градини в зоните за въздействие	бр.	С, О	3	3	100,00
	продукт	Обновени училища в зоните за въздействие	бр.	И, С, О	4	1	25,00%
	продукт	Обновени културни сгради	бр.	О	5	1*	20,00%
	продукт	Обновени административни сгради	бр.	О	3	1	33,33%
	продукт	Обновени обекти на здравеопазването	бр.	О	1	1*	
	продукт	Новосъздадени социални услуги и съответна инфраструктура - капацитет	лица	С, О	100	15	15%
Обитаване и жилищна среда	продукт	Обновени жилища в многофамилни сгради	бр.	С, О	3 450	1 061	30,75%
	резултат	Намалено потребление на енергия в обновените жилища	kWh/г.	С, О	xxx	10 094 291	-
	резултат	Обитатели с подобрена жилищна среда	бр.	С	7 600	2 122	27,92%

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК

Функционални връзки с общинската територия	продукт	Обновени детски градини и ясли извън зоните за въздействие, но в гр. Горна Оряховица	бр.	ФВ	4	1	25%
	продукт	Обновени училища извън зоните за въздействие, но в гр. Горна Оряховица	бр.	ФВ	3	0	-
	продукт	Обновени детски градини извън зоните за въздействие	бр.	ФВ	4	0	
	продукт	Обновени училища извън зоните за въздействие	бр.	ФВ	6	0	
	резултат	Брой образователни обекти с подобрено качество на услугите в резултат на обновяване и обзавеждане	бр.	ФВ	17	1	5,88%
	резултат	Брой деца/ученици, облагодетелствани от обновените обекти	бр.	С, О, ФВ	5 500	1 036	19%

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ПОПРЕЧИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР

Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР

В настоящият раздел е систематизирана информацията за идентифицираните проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР. Като цяло причините са комплексни и включват съчетанието от няколко компонента, но за целите на идентифицирането на проблемните области е изведена водеща причина.

Причините за неизпълнението на проектите, които са включени в ИПГВР са свързани с няколко основни причини, включващи:

- Заложени голям брой обекти за изпълнение;
- Липса на обществена подкрепа на етап реализация на проект за социални жилища;
- Недостатъчно финансова обезпеченост за изпълнение на ИПГВР – ограничен ресурс на ИП;
- Недостатъчно собствени средства;
- Занижен интерес от страна на частни субекти при стартиране на програми за енергийна ефективност на многофамилни сгради;
- Дълги процедура за обжалване при национална програма за обновяване на многофамилни сгради в следствие на което малък брой сгради са санирани .

В изпълнение на целите и приоритетите на ИПГВР на гр. Горна Оряховица са изпълнени други проекти, които не са включени в ИПГВР

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД

Основни изводи и препоръки за следващия период

Изводи:

ИПГВР Горна Оряховица е разработен за периода от 2014 г. до 2020 г. С него са определени средносрочните цели и приоритети за развитие на града, при отчитане на специфичните му характеристики и потенциал. Паралелно са взети предвид и стратегическите насоки за развитие на град Горна Оряховица съдържащи се в Общинския план за развитие на общината.

ИПГВР – гр. Горна Оряховица отразява общия европейски контекст на политиката за полицентрично управление и концентриране на помощта за развитие на градовете като двигатели за устойчивото развитие на регионите. Най-общо, стратегическите цели на тази политика са насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториални различия и подобряване на жизнения стандарт.

Всички изпълнени проекти отговарят на критериите за допустимост, посочени в т.4.4. от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско развитие:

- Реализирани са на територията на общината и по-точно на територията на град Горна Оряховица в зоните или във допустимите функционални връзки;
- Допринасят за подобряване на функционалните връзки и пространствените връзки, в социален, икономически и териториален контекст на града с неговата периферия (зона на влияние) в рамките на град Горна Оряховица.
- Съответстват на Общинския план за развитие на Община Горна Оряховица 2014-2020 г.

Препоръки:

Могат да бъдат направени следните препоръки за следващия програмен период:

- В определяне на бъдещи проекти, с приоритет да бъдат тези, които са в напреднал етап на проектна готовност;
- При стартиране разработката на проекти, същите да имат широка обществена подкрепа
- Да се презицира системата от индикатори на ПИРО 2120-2027, като се обърне внимание на измерването и базовите стойности;
- Да се приложи ефективна система за управление, наблюдение и оценка, като се отчита напредъка на ПИРО;
- Да има възможност за актуализация на стратегическия документ, съобразен с мерките, дейностите, проектите, източниците на финансиране.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Актуализирана матрица към финален доклад-отчет 2020
